

Белорусский государственный технологический университет
Факультет информационных технологий
Специальность программная инженерия

Отчёт по лабораторной работе №7
По дисциплине «Математическое программирование»
На тему «Сетевые модели»

Выполнил:
Студент 2 курса 8 группы
Мамонько Денис Александрович
Преподаватель: асс. Ромыш А.С.

2025, Минск

Вариант 7


Цель работы: Приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Задание 1-2. Структурное планирование. Календарное планирование.

Тема: «Создание десктопного приложения».

Код операции	Наименование операции	Предшествующие операции	t
I. АНАЛИЗ			
Z1	Системный анализ		2
Z2	Анализ требований	Z1	3
II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ			
Z3	Проектирование базы данных	Z2, Z15, Z17	3
Z4	Проектирование классов	Z2, Z17	5
Z5	Проектирование интерфейсов пользователей	Z15, Z17	3
III. КОДИРОВАНИЕ			
Z6	Кодирование интерфейсов пользователей	Z4, Z5, Z16, Z17	10
Z7	Кодирование процедур СУБД	Z3, Z4, Z15, Z17	3
Z8	Кодирование классов	Z3, Z4, Z15, Z17	6
IV. ТЕСТИРОВАНИЕ			
Z9	Функциональное тестирование	Z6, Z7, Z8, Z18	7
Z10	Структурное тестирование	Z6, Z7, Z8, Z18	3
V. ВНЕДРЕНИЕ			
Z11	Разработка документации	Z6, Z7, Z8, Z9	4
Z12	Обучение пользователей	Z9, Z11	3
Z13	Испытание	Z9, Z10, Z11, Z12	5
Z14	Завершение работ	Z13	3
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Z15	Установка СУБД	Z1	1
Z16	Установка web-сервера	Z1	1
Z17	Установка инструментария	Z1	1
Z18	Подготовка полигона	Z1	2

Задание 3. Сетевой график, нахождение критического пути.

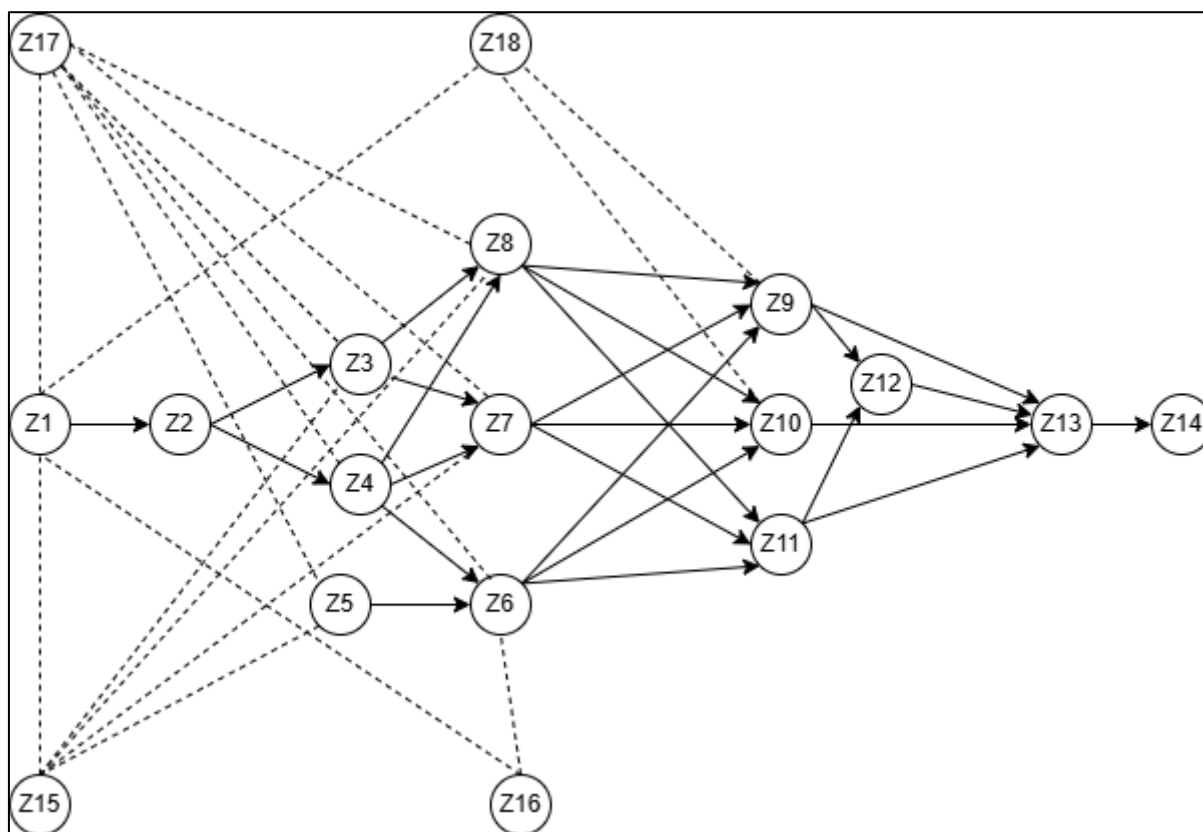

Длина критического пути: 42 дня. Последовательность задач, принадлежащих критическому пути: **Z1 → Z2 → Z4 → Z6 → Z9 → Z11 → Z12 → Z13 → Z14.**

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы был составлен структурный и календарный план создания десктопного приложения. Кроме того, был составлен сетевой график и найден критический путь.
